EQUIGRUP	FORMA DE REGISTRO DE NIVELACIÓN DE BASE PLATE DE SISTEMAS DE BOMBEO	PROYECTO: Nivelación de bombas Booster de agua tratada a instalar en la PTAP Casabe. (TAG. 36503 G/H/I).	
		ID FORMA: F. ACTUALIZACION: 06-ENE-22 REV: 01	1/1

TAG Sistema: 36503 G Serial No.: _____ Fabricante: Flowserve

Ubicación del sistema: Ptar Casabe, agua tratada


Nivelación con o sin equipos montados sobre el Skid / Base plate: Sin motor sobre skid

Equipo de medición utilizado: Nivel de gota de precisión Marca: Mitutoyo 960-602

Certificado de Calibración: L18401 Tipo de base/Bomba aplicable: API

Norma o tolerancia aplicable: 250 micrómetros por metro (0.003 pulg/pie) (0.25 mm/M)

Fecha de la medición: Marzo 13 de 2023 Hora inicio: 11:00 am Hora finalización: 12:30 pm

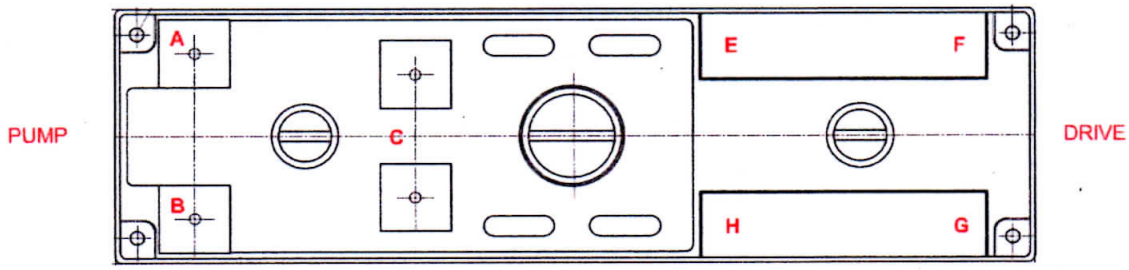

VALORES DE NIVELACIÓN					
PUNTOS DE MEDIDA	VALOR REGISTRADO (mm/Mt)	PUNTOS DE MEDIDA	VALOR REGISTRADO (mm/Mt)	PUNTOS DE MEDIDA	VALOR REGISTRADO (mm/Mt)
A-B	0.05	E-F	0.05 shim	----------	----------
A-C	0.05	E-G	0.025	----------	----------
B-C	0.05	E-H	0.025	----------	----------
		F-G	0.025	----------	----------
		F-H	0.025	----------	----------
		G-H	0.05 shim	----------	----------

NIVELADOR		VERIFICO		OTRO / CALIDAD	
NOMBRE	Frady Sierra Prada	NOMBRE		NOMBRE	
CARGO	Ing Proyectos	CARGO		CARGO	
EMPRESA	Equigrup SAS.	EMPRESA		EMPRESA	
FIRMA		FIRMA		FIRMA	

Observaciones / Notaciones / Comentarios de la medición

- Valores registrados dentro de tolerancia aplicable.
- La altura posicional de la brida de descarga respecto a la referencia cero establecida, es de 170 mm.

TAG Sistema: 36503 G Serial No.: _____ Fabricante: FLOWSERVE

REGISTRO FOTOGRAFICO:


BOMBA BOOSTER TAG. 36503 G



Nivel A-B Lado bomba



Nivel AB-C Lado bomba

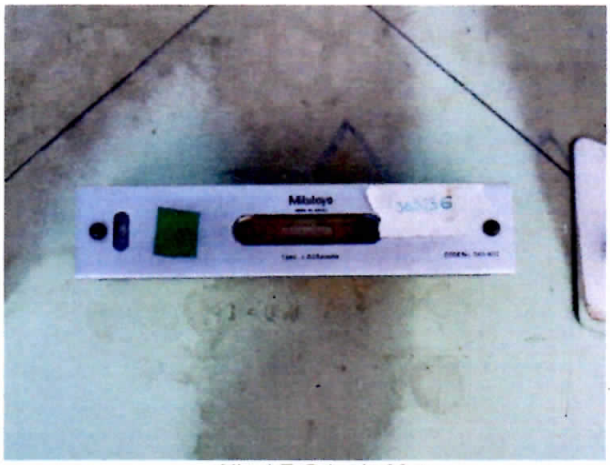

Nivel F-G Lado Motor



Altura posicional de la bomba respecto a referencia cero, 170 mm
