EQUIGRUP	FORMA DE REGISTRO DE NIVELACIÓN DE BASE PLATE DE SISTEMAS DE BOMBEO	ID FORMA: F. ACTUALIZACION: 06-ENE-22 REV: 01	
		PROYECTO: Nivelación de la unidad de bombeo de alimentación al filtro ORDEN SERVICIO:	1/1

TAG Sistema: RP-36501D Serial No.: 2200-0190 Fabricante: FLOWSERVE

Ubicación del sistema: Casabe - Agua de Producción


Nivelación con o sin equipos montados sobre el Skid / Base plate: Sin motor sobre el skid.

Equipo de medición utilizado: Nivel de gota de precisión Marca: Mitutoyo Ref. 960-602.

Certificado de Calibración: L18401 Tipo de base/Bomba aplicable: API

Norma o tolerancia aplicable: 250 micrómetros por metro (0.003 pulg/pie) (0.25 mm/M)

Fecha de la medición: Mayo 23 de 2023 Hora inicio: 9:00 am Hora finalización: 12:42 pm

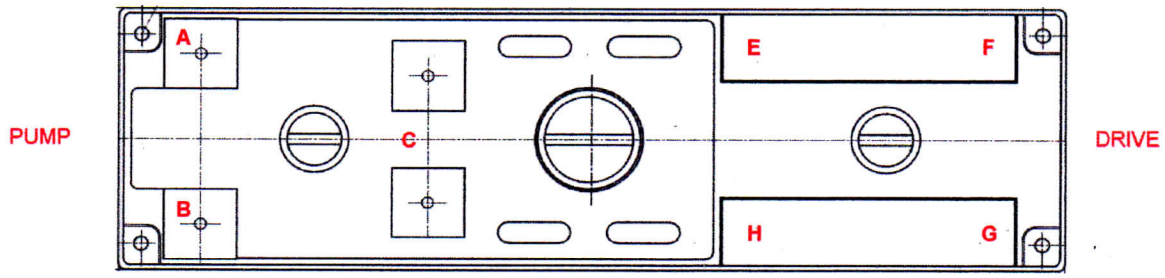

VALORES DE NIVELACIÓN					
PUNTOS DE MEDIDA	VALOR REGISTRADO (mm/Mt)	PUNTOS DE MEDIDA	VALOR REGISTRADO (mm/Mt)	PUNTOS DE MEDIDA	VALOR REGISTRADO (mm/Mt)
A-B	0.00	E-F	0.00	----------	----------
A-C	0.00	E-G	0.025	----------	----------
B-C	0.00	E-H	0.00	----------	----------
		F-G	0.25	----------	----------
		F-H	0.00	----------	----------
		G-H	0.00	----------	----------

NIVELADOR		VERIFICO		OTRO / CALIDAD	
NOMBRE	Fredy A. Sierra Prada	NOMBRE		NOMBRE	
CARGO	Ing. Proyectos	CARGO		CARGO	
EMPRESA	Equigrup SAS.	EMPRESA		EMPRESA	
FIRMA		FIRMA		FIRMA	

Observaciones / Notaciones / Comentarios de la medición

Valores registrados de nivelación dentro de tolerancia aplicable.

Altura promedio del grout de nivelacion/apoyo es de 1-1/16 in (27 mm).

Anexo Certificado de calibracion del instrumento.
