INSTALACIÓN DE ANCLAJES CON EPOXICO PARA LA INSTALACIÓN PIPE MILL - APARTADÓ ANTIOQUIA			
Contratante: ArcelorMittal Project Colombia S.A.S NIT: 900577966 Calle 90, 12-45 oficina 605 Bogotá – Colombia	Informe Reporte final	**Equipo:**	PIPE MILL
		Encargado:	Anderson Caliman Ventorim
		Fecha del informe:	Julio 24 de 2023
Numero de contrato: PURCHASE ORDER 2023-95 & 2023-96		**Tiempo de ejecución:**	4 días comprendidos entre el 10 de Julio al 13 de julio del 2023.


OBJETIVO:
Realizar la prestación de servicios profesionales de instalación de anclajes de fijación y aplicación de resinas epoxicas para la instalación de soportes del proyecto PIPE Mill en APARTADÓ ANTIOQUIA.

ALCANCE:
A. Suministro de equipos y personal para la perforación, instalación y fijación con resina epoxica de anclajes ∅¾", todos con empotramiento de 130 - 150mm en el proyecto Spiral Mill en APARTADÓ ANTIOQUIA.

B. Suministro de 7200 centímetros cúbicos de resina epoxica para la fijación e instalación de aproximadamente 144 anclajes de ∅¾" con empotramiento de 130 - 150mm.


Cualquier inquietud adicional que tenga al respecto, por favor no dude en comunicarse con nosotros a los teléfonos 310-263 1052 o 311-531 5768.

Ejecutor:



Ing. Fredy Alberto Sierra Prada
Gerente Proyectos EQUIGRUP SAS

1. LAYOUT, UBICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE ANCLAJES INSTALADOS

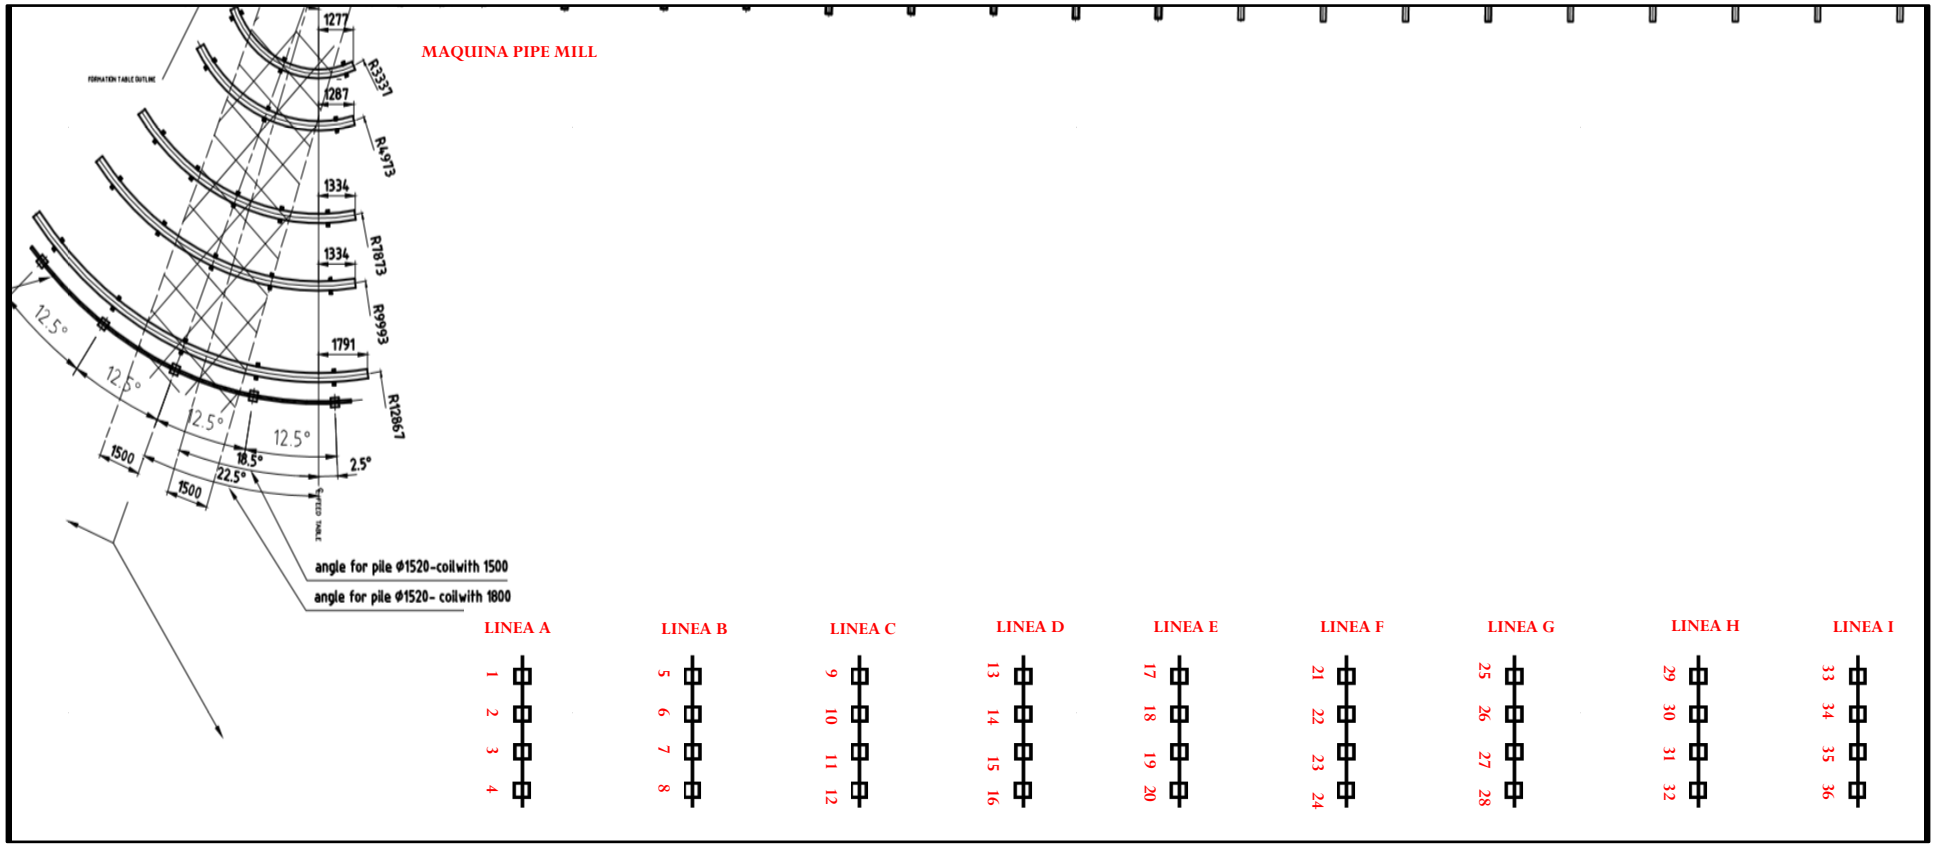

2. INFORMACIÓN DE DETALLE DE PERNOS DE ANCLAJE INSTALADOS

DETALLE DE PERNOS DE ANCLAJE INSTALADOS

ID-No. Anclaje	Ubicación-Equipo	Cant	Diametro de base de anclaje	Especificación Anclaje	Longitudes/espesores adicionales				Empotramiento en concreto	Longitud Total Anclaje (1)	Cantidad adhesivo epoxico x anclaje (onz)
					Altura platina de anclaje/apoyo	Espesor de la tuerca (2H)	Longitud ajuste nivelación (grout) (1)	Espacio Libre Superior			
1	LINEA A- PLACA 1	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	131,50	200,00	2,03
2	LINEA A- PLACA 1	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	135,00	200,00	2,08
3	LINEA A- PLACA 1	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	132,00	200,00	2,04
4	LINEA A- PLACA 1	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	131,00	200,00	2,02
5	LINEA A- PLACA 2	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	132,00	200,00	2,04
6	LINEA A- PLACA 2	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	131,50	200,00	2,03
7	LINEA A- PLACA 2	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	132,50	200,00	2,05
8	LINEA A- PLACA 2	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	140,00	200,00	2,16
9	LINEA A- PLACA 3	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	133,50	200,00	2,06
10	LINEA A- PLACA 3	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	140,00	200,00	2,16
11	LINEA A- PLACA 3	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	140,00	200,00	2,16
12	LINEA A- PLACA 3	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	131,50	200,00	2,03
13	LINEA A- PLACA 4	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	133,00	200,00	2,05
14	LINEA A- PLACA 4	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	132,00	200,00	2,04
15	LINEA A- PLACA 4	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	133,00	200,00	2,05
16	LINEA A- PLACA 4	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	135,00	200,00	2,08
17	LINEA B- PLACA 5	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	138,00	200,00	2,13
18	LINEA B- PLACA 5	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	135,00	200,00	2,08
19	LINEA B- PLACA 5	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	141,00	200,00	2,18
20	LINEA B- PLACA 5	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	137,00	200,00	2,11
21	LINEA B- PLACA 6	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	139,00	200,00	2,15
22	LINEA B- PLACA 6	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	139,00	200,00	2,15
23	LINEA B- PLACA 6	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	138,00	200,00	2,13
24	LINEA B- PLACA 6	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	139,00	200,00	2,15
25	LINEA B- PLACA 7	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	137,00	200,00	2,11
26	LINEA B- PLACA 7	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	138,00	200,00	2,13
27	LINEA B- PLACA 7	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	140,00	200,00	2,16
28	LINEA B- PLACA 7	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	137,00	200,00	2,11

EQUIGRUP	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN		
	FORMA: EG23-152S	**ACTUALIZACIÓN:** 17/05/2023	**REVISIÓN:** 00
PROYECTO: INSTALACIÓN DE ANCLAJES CON EPOXICO PARA LA INSTALACIÓN PIPE MILL - APARTADÓ ANTIOQUIA.			**OS/OC-ORDEN No.** 2023-95 & 2023-96

DETALLE DE PERNOS DE ANCLAJE INSTALADOS

ID-No. Anclaje	Ubicación-Equipo	Cant	Diametro de base de anclaje	Especificación Anclaje	Longitudes/espesores adicionales				Empotramiento en concreto	Longitud Total Anclaje (1)	Cantidad adhesivo epoxico x anclaje (onz)
					Altura platina de anclaje/apoyo	Espesor de la tuerca (2H)	Longitud ajuste nivelación (grout) (1)	Espacio Libre Superior			
29	LINEA B- PLACA 8	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	137,00	200,00	2,11
30	LINEA B- PLACA 8	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	140,00	200,00	2,16
31	LINEA B- PLACA 8	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	136,00	200,00	2,10
32	LINEA B- PLACA 8	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	135,00	200,00	2,08
33	LINEA C- PLACA 9	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	132,00	200,00	2,04
34	LINEA C- PLACA 9	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	136,00	200,00	2,10
35	LINEA C- PLACA 9	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	138,00	200,00	2,13
36	LINEA C- PLACA 9	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	140,00	200,00	2,16
37	LINEA C- PLACA 10	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	139,00	200,00	2,15
38	LINEA C- PLACA 10	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	136,00	200,00	2,10
39	LINEA C- PLACA 10	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	140,00	200,00	2,16
40	LINEA C- PLACA 10	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	140,00	200,00	2,16
41	LINEA C- PLACA 11	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	137,00	200,00	2,11
42	LINEA C- PLACA 11	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	136,00	200,00	2,10
43	LINEA C- PLACA 11	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	143,00	200,00	2,21
44	LINEA C- PLACA 11	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	141,00	200,00	2,18
45	LINEA C- PLACA 12	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	135,00	200,00	2,08
46	LINEA C- PLACA 12	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	135,00	200,00	2,08
47	LINEA C- PLACA 12	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	140,00	200,00	2,16
48	LINEA C- PLACA 12	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	138,00	200,00	2,13
49	LINEA D- PLACA 13	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	137,00	200,00	2,11
50	LINEA D- PLACA 13	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	137,00	200,00	2,11
51	LINEA D- PLACA 13	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	137,00	200,00	2,11
52	LINEA D- PLACA 13	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	142,00	200,00	2,19
53	LINEA D- PLACA 14	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	138,00	200,00	2,13
54	LINEA D- PLACA 14	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	137,00	200,00	2,11
55	LINEA D- PLACA 14	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	137,00	200,00	2,11
56	LINEA D- PLACA 14	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	140,00	200,00	2,16
57 (2)	LINEA D- PLACA 15	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	140,00	200,00	2,78
58 (2)	LINEA D- PLACA 15	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	139,00	200,00	2,76

EQUIGRUP	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN		
	FORMA: EG23-152S	**ACTUALIZACIÓN:** 17/05/2023	**REVISIÓN:** 00
PROYECTO: INSTALACIÓN DE ANCLAJES CON EPOXICO PARA LA INSTALACIÓN PIPE MILL - APARTADÓ ANTIOQUIA.			**OS/OC-ORDEN No.** 2023-95 & 2023-96

DETALLE DE PERNOS DE ANCLAJE INSTALADOS

ID-No. Anclaje	Ubicación-Equipo	Cant	Diametro de base de anclaje	Especificación Anclaje	Longitudes/espesores adicionales				Empotramiento en concreto	Longitud Total Anclaje (1)	Cantidad adhesivo epoxico x anclaje (onz)
					Altura platina de anclaje/apoyo	Espesor de la tuerca (2H)	Longitud ajuste nivelación (grout) (1)	Espacio Libre Superior			
59	LINEA D- PLACA 15	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	138,00	200,00	2,13
60	LINEA D- PLACA 15	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	137,00	200,00	2,11
61 (2)	LINEA D- PLACA 16	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	138,00	200,00	2,74
62 (2)	LINEA D- PLACA 16	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	136,00	200,00	2,70
63	LINEA D- PLACA 16	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	135,00	200,00	2,08
64	LINEA D- PLACA 16	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	141,00	200,00	2,18
65	LINEA E- PLACA 17	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	140,00	200,00	2,16
66	LINEA E- PLACA 17	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	140,00	200,00	2,16
67	LINEA E- PLACA 17	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	139,00	200,00	2,15
68	LINEA E- PLACA 17	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	138,00	200,00	2,13
69	LINEA E- PLACA 18	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	135,00	200,00	2,08
70	LINEA E- PLACA 18	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	134,00	200,00	2,07
71	LINEA E- PLACA 18	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	138,00	200,00	2,13
72	LINEA E- PLACA 18	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	141,00	200,00	2,18
73 (2)	LINEA E- PLACA 19	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	141,00	200,00	2,80
74 (2)	LINEA E- PLACA 19	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	139,00	200,00	2,76
75	LINEA E- PLACA 19	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	137,00	200,00	2,11
76	LINEA E- PLACA 19	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	137,00	200,00	2,11
77 (2)	LINEA E- PLACA 20	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	140,00	200,00	2,78
78 (2)	LINEA E- PLACA 20	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	140,00	200,00	2,78
79	LINEA E- PLACA 20	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	136,00	200,00	2,10
80	LINEA E- PLACA 20	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	137,00	200,00	2,11
81	LINEA F- PLACA 21	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	136,00	200,00	2,10
82	LINEA F- PLACA 21	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	136,00	200,00	2,10
83	LINEA F- PLACA 21	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	136,50	200,00	2,11
84	LINEA F- PLACA 21	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	137,00	200,00	2,11
85	LINEA F- PLACA 22	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	138,00	200,00	2,13
86	LINEA F- PLACA 22	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	140,50	200,00	2,17
87	LINEA F- PLACA 22	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	138,50	200,00	2,14
88	LINEA F- PLACA 22	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	138,00	200,00	2,13

EQUIGRUP	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN		
	FORMA: EG23-152S	**ACTUALIZACIÓN:** 17/05/2023	**REVISIÓN:** 00
PROYECTO: INSTALACIÓN DE ANCLAJES CON EPOXICO PARA LA INSTALACIÓN PIPE MILL - APARTADÓ ANTIOQUIA.			**OS/OC-ORDEN No.** 2023-95 & 2023-96

DETALLE DE PERNOS DE ANCLAJE INSTALADOS

ID-No. Anclaje	Ubicación-Equipo	Cant	Diametro de base de anclaje	Especificación Anclaje	Longitudes/espesores adicionales				Empotramiento en concreto	Longitud Total Anclaje (1)	Cantidad adhesivo epoxico x anclaje (onz)
					Altura platina de anclaje/apoyo	Espesor de la tuerca (2H)	Longitud ajuste nivelación (grout) (1)	Espacio Libre Superior			
89	LINEA F- PLACA 23	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	137,50	200,00	2,12
90	LINEA F- PLACA 23	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	136,50	200,00	2,11
91	LINEA F- PLACA 23	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	136,50	200,00	2,11
92	LINEA F- PLACA 23	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	137,00	200,00	2,11
93	LINEA F- PLACA 24	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	137,50	200,00	2,12
94	LINEA F- PLACA 24	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	135,00	200,00	2,08
95	LINEA F- PLACA 24	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	137,00	200,00	2,11
96	LINEA F- PLACA 24	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	144,00	200,00	2,22
97	LINEA G- PLACA 25	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	140,00	200,00	2,16
98	LINEA G- PLACA 25	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	139,50	200,00	2,15
99	LINEA G- PLACA 25	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	138,00	200,00	2,13
100	LINEA G- PLACA 25	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	138,00	200,00	2,13
101	LINEA G- PLACA 26	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	141,00	200,00	2,18
102	LINEA G- PLACA 26	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	140,00	200,00	2,16
103	LINEA G- PLACA 26	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	140,00	200,00	2,16
104	LINEA G- PLACA 26	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	136,50	200,00	2,11
105	LINEA G- PLACA 27	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	133,00	200,00	2,05
106	LINEA G- PLACA 27	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	132,00	200,00	2,04
107	LINEA G- PLACA 27	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	136,00	200,00	2,10
108	LINEA G- PLACA 27	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	137,50	200,00	2,12
109	LINEA G- PLACA 28	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	138,00	200,00	2,13
110 (2)	LINEA G- PLACA 28	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	137,50	200,00	2,46
111 (2)	LINEA G- PLACA 28	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	135,50	200,00	2,42
112	LINEA G- PLACA 28	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	140,00	200,00	2,16
113	LINEA H- PLACA 29	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	138,00	200,00	2,13
114	LINEA H- PLACA 29	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	138,50	200,00	2,14
115	LINEA H- PLACA 29	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	137,50	200,00	2,12
116	LINEA H- PLACA 29	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	138,00	200,00	2,13
117	LINEA H- PLACA 30	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	136,50	200,00	2,11
118	LINEA H- PLACA 30	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	139,50	200,00	2,15

EQUIGRUP	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN		
	FORMA: EG23-152S	**ACTUALIZACIÓN:** 17/05/2023	**REVISIÓN:** 00
PROYECTO: INSTALACIÓN DE ANCLAJES CON EPOXICO PARA LA INSTALACIÓN PIPE MILL - APARTADÓ ANTIOQUIA.			**OS/OC-ORDEN No.** 2023-95 & 2023-96

DETALLE DE PERNOS DE ANCLAJE INSTALADOS

ID-No. Anclaje	Ubicación-Equipo	Cant	Diametro de base de anclaje	Especificación Anclaje	Longitudes/espesores adicionales				Empotramiento en concreto	Longitud Total Anclaje (1)	Cantidad adhesivo epoxico x anclaje (onz)
					Altura platina de anclaje/apoyo	Espesor de la tuerca (2H)	Longitud ajuste nivelación (grout) (1)	Espacio Libre Superior			
119	LINEA H- PLACA 30	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	139,50	200,00	2,15
120	LINEA H- PLACA 30	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	139,00	200,00	2,15
121	LINEA H- PLACA 31	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	137,00	200,00	2,11
122	LINEA H- PLACA 31	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	133,50	200,00	2,06
123	LINEA H- PLACA 31	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	137,00	200,00	2,11
124	LINEA H- PLACA 31	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	138,00	200,00	2,13
125	LINEA H- PLACA 32	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	135,50	200,00	2,09
126	LINEA H- PLACA 32	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	140,00	200,00	2,16
127	LINEA H- PLACA 32	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	138,00	200,00	2,13
128	LINEA H- PLACA 32	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	138,00	200,00	2,13
129	LINEA I- PLACA 33	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	138,00	200,00	2,13
130	LINEA I- PLACA 33	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	138,50	200,00	2,14
131	LINEA I- PLACA 33	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	137,50	200,00	2,12
132	LINEA I- PLACA 33	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	136,00	200,00	2,10
133	LINEA I- PLACA 34	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	137,50	200,00	2,12
134	LINEA I- PLACA 34	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	138,00	200,00	2,13
135	LINEA I- PLACA 34	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	138,00	200,00	2,13
136	LINEA I- PLACA 34	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	133,50	200,00	2,06
137	LINEA I- PLACA 35	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	132,00	200,00	2,04
138	LINEA I- PLACA 35	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	138,00	200,00	2,13
139	LINEA I- PLACA 35	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	138,00	200,00	2,13
140	LINEA I- PLACA 35	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	134,50	200,00	2,08
141	LINEA I- PLACA 36	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	135,00	200,00	2,08
142	LINEA H- PLACA 32	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	134,50	200,00	2,08
143	LINEA H- PLACA 32	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	138,00	200,00	2,13
144	LINEA H- PLACA 32	1	19,05	B7 ∅5/8"	19,00	20,00	40,00	8,00	136,50	200,00	2,11
										(3)	310,70

EQUIGRUP	***INFORME FINAL DE EJECUCIÓN***		
	FORMA: EG23-152S	**ACTUALIZACIÓN:** 17/05/2023	**REVISIÓN:** 00
PROYECTO: INSTALACIÓN DE ANCLAJES CON EPOXICO PARA LA INSTALACIÓN PIPE MILL - APARTADÓ ANTIOQUIA.			**OS/OC-ORDEN No.** 2023-95 & 2023-96

NOTAS
(1) La longitud de los pernos de anclaje y de ajuste para nivelación es la misma para cada placa, independientemente de la profundidad de la perforación en concreto y del desnivel que pueda tener el piso entre placas de acero. (2) Perforación muy cercada o en límite de junta de separación/dilatación existente en lozas de concreto del piso, algunas perforaciones con fracturación a borde, retiro del area de la junta/icopor y lleno en su totalidad con resina epoxica. (3) Consumo sin desperdicios.
