
PERFORACIONES EN CIMENTACIÓN PARA ANCLAJES POS-INSTALADOS CON GROUT EPOXICO PARA EL COMPRESOR K12581 PLANTA DE GAS DEL CAMPO LA CIRA – INFANTAS			
Contratante: TECNIORIENTE ENERGY AND WELL SERVICES SAS NIT: 834001427 Vereda La Forest, Corregimiento el Centro, Barrancabermeja, Santander.	Informe Reporte final	**Equipo:**	NUEVO COMPRESOR K12581
		Encargado:	Jairo Feria Moron
		Fecha del informe:	Noviembre 01 de 2024
Numero de contrato: ODC BRR 4999		**Tiempo de ejecución:**	8 días comprendidos entre el 24 al 31 de octubre del 2024.

OBJETIVO:
Realizar la prestación de servicios profesionales de supervisión en la instalación de anclajes proyectados para la fijación del compresor K-12581.

ALCANCE:
A. Suministro de equipos y personal para la perforación de la cimentación existente con sistema saca núcleos de anclajes, ∅4” (10,16 cm) x 50 cm, en la Planta De Gas Del Campo La Cira – Infantas.


Cualquier inquietud adicional que tenga al respecto, por favor no dude en comunicarse con nosotros a los teléfonos 310-263 1052 o 311-531 5768.

Ejecutor:



Ing. Fredy Alberto Sierra Prada
Gerente Proyectos EQUIGRUP SAS

1. LAYOUT, UBICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE PERFORACIONES

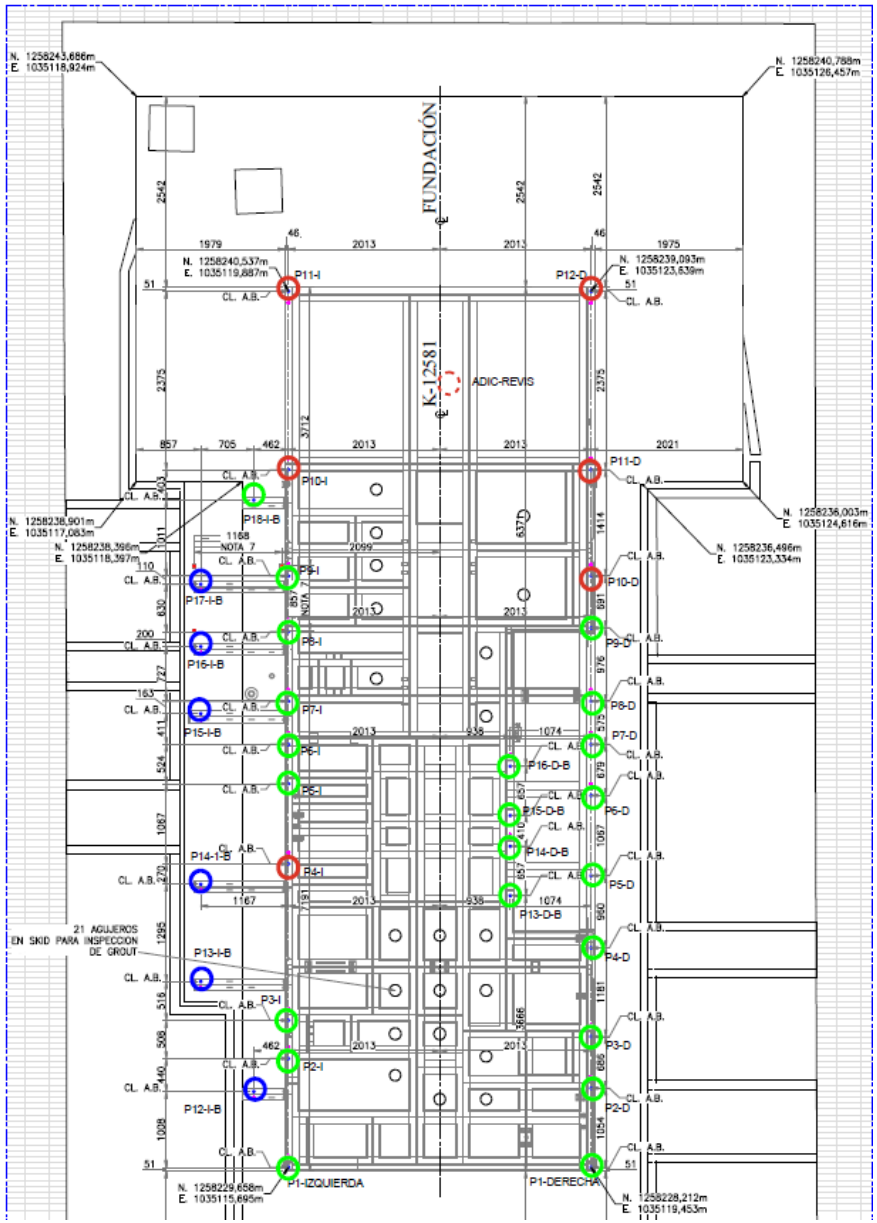

2. INFORMACIÓN DE DETALLE DE LAS PERFORACIONES

DETALLE DE PERFORACIONES PARA PERNOS DE ANCLAJE COMPRESOR K12581

Color Del Circulo	ID-No. Anclaje	Ubicación-Equipo	Cant	Diametro De La Perforación	Profundidad De La Perforación (cm)	Estado De La Perforación Realizada				Cumplimiento Del Requerimiento Para Anclajes (Propuesto)	Observaciones	Recomendación/Acción
						Presenta Grieta, Fisura	Cant De Grieta - Fisura	Ubicación Desde Nivel Superior	Altura-Apertura De Grietas, Fisuras			
VERDE	1D	COSTADO DERECHO	1	4" (10,16)	49,50	SI	1,0	13,0	0,0	SI	Ninguna	
VERDE	2D	COSTADO DERECHO	1	4" (10,16)	51,00	SI	1,0	13,2	0,0	SI	Ninguna	
VERDE	3D	COSTADO DERECHO	1	4" (10,16)	52,00	SI	1,0	13,4	0,0	SI	Ninguna	
VERDE	4D	COSTADO DERECHO	1	4" (10,16)	52,50	SI	1,0	12,8	0,0	SI	Ninguna	
VERDE	5D	COSTADO DERECHO	1	4" (10,16)	51,00	SI	1,0	13,1	0,0	SI	Ninguna	
VERDE	6D	COSTADO DERECHO	1	4" (10,16)	49,50	SI	1,0	13,3	0,0	SI	Ninguna	
VERDE	7D	COSTADO DERECHO	1	4" (10,16)	52,00	SI	1,0	13,5	0,0	SI	Ninguna	
VERDE	8D	COSTADO DERECHO	1	4" (10,16)	52,00	SI	1,0	13,1	0,0	SI	Ninguna	
VERDE	9D	COSTADO DERECHO	1	4" (10,16)	51,00	SI	1,0	13,9	0,0	SI	Ninguna	
ROJO	10D	COSTADO DERECHO	1	4" (10,16)	51,00	SI	2,0	16,5 46,0	2,0 0,50	NO	Presenta filtración de agua posiblemente por extensión de la ultima grieta	Beben sellarsen las grietas y garantizar el monolitismo (unión entre si) de la estructura de concreto. Según el capítulo 4 de la API 686.
ROJO	11D	COSTADO DERECHO	1	4" (10,16)	41,00	SI	1,0	27,0	0,5	NO	A una profundidad de 18 cm inicia la salida de material suelto del proceso de perforado, punto partir del cual la broca se profundiza sola sin tensión de corte y restricción de material firme, en 41 cm de profundida se acaba el concreto y se muestra arena.	Ajustar las caracteristicas de la cimentación a las especificadas en el diseño de los pernos de anclaje para el compresor K12581: Concreto No fisurado, tipo: C,Retrocesos laterales T: 1.40m, Profundidad de cimentación: 1.28 m, Resistencia a la Compresión (f'c): 28 Mpa.
ROJO	12D	COSTADO DERECHO	1	4" (10,16)	39,00	SI	1,00	18,00	0,00	NO	A una profundidad de 39 cm se encuentra material particulado-agregado y se acaba el concreto.	Ajustar las caracteristicas de la cimentación a las especificadas en el diseño de los pernos de anclaje para el compresor K12581: Concreto No fisurado, tipo: C,Retrocesos laterales T: 1.40m, Profundidad de cimentación: 1.28 m, Resistencia a la Compresión (f'c): 28 Mpa.
VERDE	13D-I	INTERIOR COSTADO DERECHO	1	4" (10,16)	50,00	SI	1,00	14,70	0,00	SI	Ninguna	
VERDE	14D-I	INTERIOR COSTADO DERECHO	1	4" (10,16)	51,50	SI	1,00	14,50	0,00	SI	Ninguna	
VERDE	15D-I	INTERIOR COSTADO DERECHO	1	4" (10,16)	55,00	SI	1,00	14,90	0,00	SI	Material débil al fondo que conllevo a extralimitación en el acondicionamiento de la profundidad de la perforación.	
VERDE	16D-I	INTERIOR COSTADO DERECHO	1	4" (10,16)	55,00	SI	1,00	19,00	0,00	SI	Material débil al fondo que conllevo a extralimitación en el acondicionamiento de la profundidad de la perforación.	
VERDE	1I	COSTADO IZQUIERDO	1	4" (10,16)	52,00	SI	1,00	12,80	0,00	SI	Ninguna	
VERDE	2I	COSTADO IZQUIERDO	1	4" (10,16)	51,00	SI	1,00	13,20	0,00	SI	Ninguna	
VERDE	3I	COSTADO IZQUIERDO	1	4" (10,16)	51,00	SI	1,00	13,20	0,00	SI	Ninguna	

EQUIGRUP	**INFORME FINAL DE EJECUCIÓN**		
	FORMA: EG24-195S	**ACTUALIZACIÓN:** 17/05/2023	**REVISIÓN:** 00
PROYECTO: PERFORACIONES EN CIMENTACIÓN PARA ANCLAJES POS-INSTALADOS CON GROUT EPOXICO PARA EL COMPRESOR K12581 PLANTA DE GAS DEL CAMPO LA CIRA – INFANTAS.			**OS/OC-ORDEN No.** BRR-4999

DETALLE DE PERFORACIONES PARA PERNOS DE ANCLAJE COMPRESOR K12581

Color Del Circulo	ID-No. Anclaje	Ubicación-Equipo	Cant	Diametro De La Perforación	Profundidad De La Perforación (cm)	Estado De La Perforación Realizada				Cumplimiento Del Requerimiento Para Anclajes (Propuesto)	Observaciones	Recomendación/Acción
						Presenta Grieta, Fisura	Cant De Grieta - Fisura	Ubicación Desde Nivel Superior	Altura-Apertura De Grietas, Fisuras			
ROJO	4I	COSTADO IZQUIERDO	1	4" (10,16)	49,00	SI	1,00	13,50	0,00	NO	Durante la perforación salio aceite junto con el agua de refrigeración. En el acondicionamiento se limpia con grata y desengrasante pero el agua de limpieza retirada se mantiene viscosa y al igual que el olor a hidraulico.	El sustrato de la perforación debe estar seco y libre de aceite, grasa, agentes de curado, impregnaciones, partículas extrañas, recubrimientos y materiales sueltos. Superficie de concreto y preparación según el capítulo 5 de la API 686.
VERDE	5I	COSTADO IZQUIERDO	1	4" (10,16)	55,00	SI	1,00	13,30	0,00	SI	Material débil al fondo que conllevo a extralimitación en el acondicionamiento de la profundidad de la perforación.	
VERDE	6I	COSTADO IZQUIERDO	1	4" (10,16)	52,00	SI	1,00	13,10	0,00	SI	Material débil al fondo que conllevo a extralimitación en el acondicionamiento de la profundidad de la perforación.	
VERDE	7I	COSTADO IZQUIERDO	1	4" (10,16)	55,00	SI	1,00	13,80	0,00	SI	Material débil al fondo que conllevo a extralimitación en el acondicionamiento de la profundidad de la perforación.	
VERDE	8I	COSTADO IZQUIERDO	1	4" (10,16)	53,00	SI	1,00	13,50	0,00	SI	Material débil al fondo que conllevo a extralimitación en el acondicionamiento de la profundidad de la perforación.	
VERDE	9I	COSTADO IZQUIERDO	1	4" (10,16)	50,50	SI	1,00	13,10	0,00	SI	Ninguna	
ROJO	10I	COSTADO IZQUIERDO	1	4" (10,16)	41,00	SI	2,00	20,80 38,00	0,00 0,00	NO	A una profundidad de 40 cm inicia la salida de material suelto del proceso de perforado, punto partir del cual la broca se profundiza sola sin tensión de corte y restricción de material firme, en 41 cm de profundida se acaba el concreto y se muestra arena.	Ajustar las caracteristicas de la cimentación a las especificadas en el diseño de los pernos de anclaje para el compresor K12581: Concreto No fisurado, tipo: C,Retrocesos laterales T: 1.40m, Profundidad de cimentación: 1.28 m, Resistencia a la Compresión (f'c): 28 Mpa.
ROJO	11I	COSTADO IZQUIERDO	1	4" (10,16)	38,00	SI	1,00	17,00	0,00	NO	A una profundidad de 36 cm se encuentra material particulado-agregado y se acaba el concreto.	Ajustar las caracteristicas de la cimentación a las especificadas en el diseño de los pernos de anclaje para el compresor K12581: Concreto No fisurado, tipo: C,Retrocesos laterales T: 1.40m, Profundidad de cimentación: 1.28 m, Resistencia a la Compresión (f'c): 28 Mpa.
AZUL	12I-B	COSTADO IZQUIERDO	1	4" (10,16)	42,00	SI	1,00	12,00	0,00	SI	Ninguna	Ajustar y aprobar el diseño del perno de anclaje a instalar.
AZUL	13I-B	COSTADO IZQUIERDO	1	4" (10,16)	43,00	SI	1,00	13,40	0,00	SI	Ninguna	Ajustar y aprobar el diseño del perno de anclaje a instalar.
AZUL	14I-B	COSTADO IZQUIERDO	1	4" (10,16)	41,00	SI	1,00	13,10	0,00	SI	Ninguna	Ajustar y aprobar el diseño del perno de anclaje a instalar.
AZUL	15I-B	COSTADO IZQUIERDO	1	4" (10,16)	41,00	SI	1,00	13,50	0,00	SI	Ninguna	Ajustar y aprobar el diseño del perno de anclaje a instalar.
AZUL	16I-B	COSTADO IZQUIERDO	1	4" (10,16)	41,00	SI	1,00	13,60	0,00	SI	Ninguna	Ajustar y aprobar el diseño del perno de anclaje a instalar.

EQUIGRUP	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN		
	FORMA: EG24-195S	**ACTUALIZACIÓN:** 17/05/2023	**REVISIÓN:** 00
PROYECTO: PERFORACIONES EN CIMENTACIÓN PARA ANCLAJES POS-INSTALADOS CON GROUT EPOXICO PARA EL COMPRESOR K12581 PLANTA DE GAS DEL CAMPO LA CIRA – INFANTAS.			**OS/OC-ORDEN No.** BRR-4999

DETALLE DE PERFORACIONES PARA PERNOS DE ANCLAJE COMPRESOR K12581

Color Del Circulo	ID-No. Anclaje	Ubicación-Equipo	Cant	Diametro De La Perforación	Profundidad De La Perforación (cm)	Estado De La Perforación Realizada				Cumplimiento Del Requerimiento Para Anclajes (Propuesto)	Observaciones	Recomendación/Acción
						Presenta Grieta, Fisura	Cant De Grieta - Fisura	Ubicación Desde Nivel Superior	Altura-Apertura De Grietas, Fisuras			
AZUL	17I-B	COSTADO IZQUIERDO	1	4" (10,16)	42,00	SI	1,00	13,20	0,00	SI	Ninguna	Ajustar y aprobar el diseño del perno de anclaje a instalar.
VERDE	18I-B	COSTADO IZQUIERDO	1	4" (10,16)	50,00	SI	1,00	13,40	0,00	SI	Ninguna	
ROJO	ADIC-REVIS	CENTRO ÁREA COOLER	0	4" (10,16)	32,00	SI	1,00	15,60	0,00	NO APLICA	Presenta filtración de agua, en 32 cm de profundida se acaba el concreto y se muestra arena.	Debe sellarse la perforación con Concreto No fisurado, tipo: C, Profundidad de cimentación: 1.28 m, Resistencia a la Compresión (f'c): 28 Mpa.
	35 (1S)	COSTADO IZQUIERDO SOPORTE	1								Pendiente por presentación de soporte/estructura.	
	36 (2S)	COSTADO IZQUIERDO SOPORTE	1								Pendiente por presentación de soporte/estructura.	
	37 (3S)	COSTADO IZQUIERDO SOPORTE	1								Pendiente por presentación de soporte/estructura.	
	38 (4S)	COSTADO IZQUIERDO SOPORTE	1								Pendiente por presentación de soporte/estructura.	
			38									
